Rev:04 - 22-05-2020
Af: LINES

Endelave Havn Nyt fenderværk i færgeleje
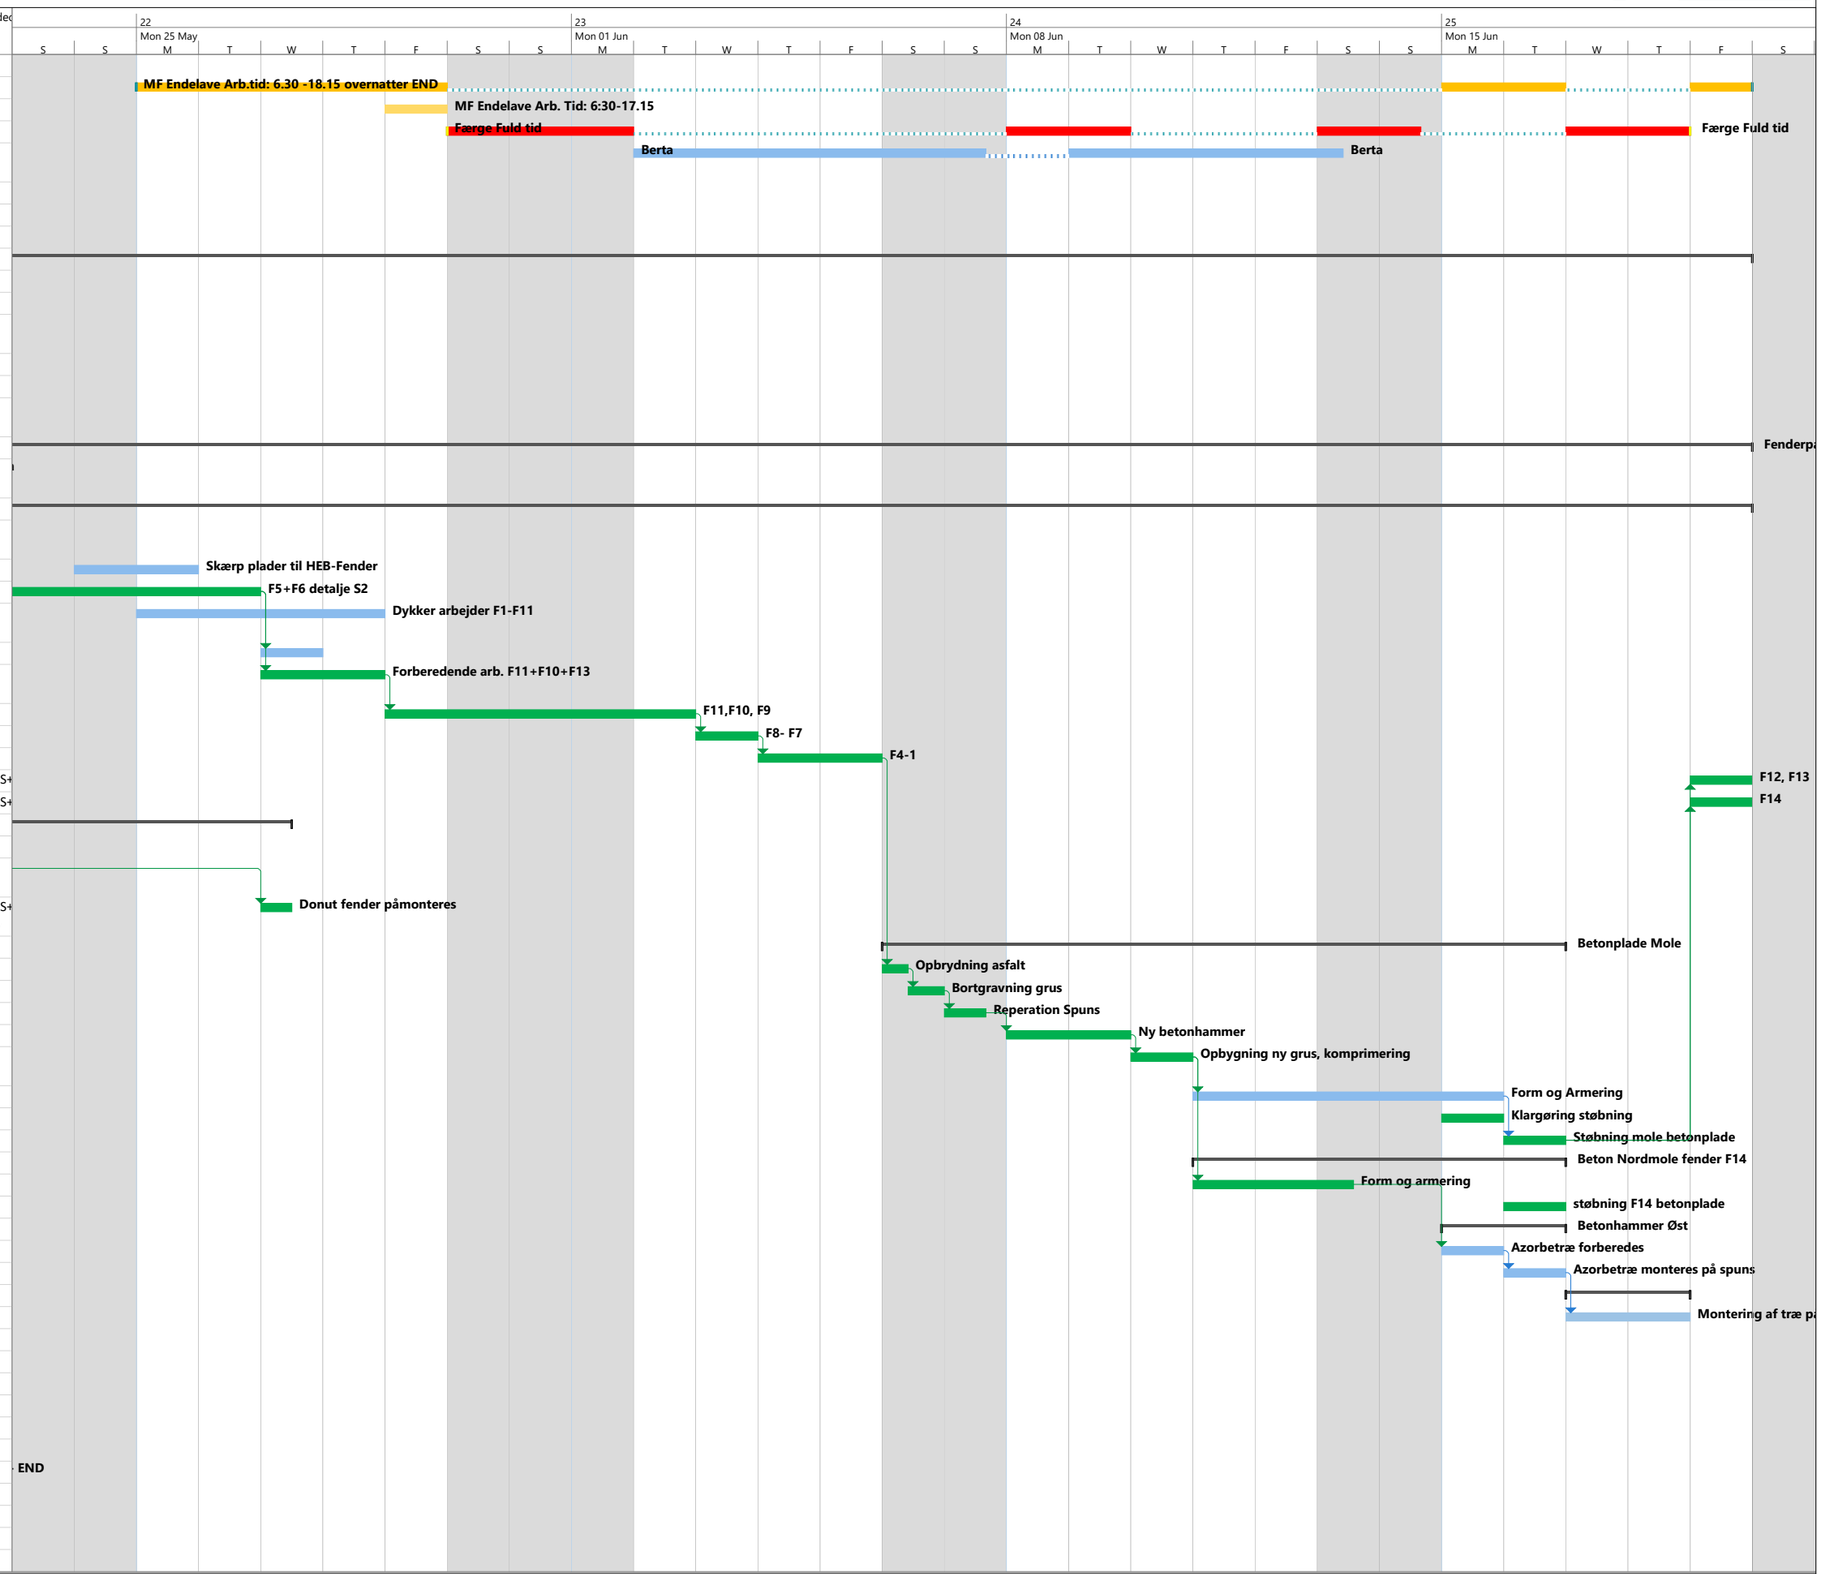
ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predec
1	Færge ude af drift	14 days	Mon 27-04-20	Fri 15-05-20	
2	MF Endelave Arb.tid: 6.30 -18.15 overnatter END	8 days	Mon 25-05-20	Fri 19-06-20	
3	MF Endelave Arb. Tid: 6:30-17.15	1 day?	Fri 29-05-20	Fri 29-05-20	
4	Færge Fuld tid	10 days	Sat 30-05-20	Thu 18-06-20	
5	Berta	11 days	Tue 02-06-20	Sat 13-06-20	
6	<New Task>	1 day?	Mon 20-04-20	Mon 20-04-20	
7	<New Task>	1 day?	Mon 20-04-20	Mon 20-04-20	
8		1 day?	Mon 20-04-20	Mon 20-04-20	
9	**Endelavne Havn**	**42 days**	**Mon 20-04-20**	**Fri 19-06-20**	
10	Forberedelse	5 days	Mon 20-04-20	Fri 24-04-20	
11	Opstartsmøde	1 day?	Mon 27-04-20	Mon 27-04-20	10
12	Nedbrydning af lysmaster, andet aptering	2 days	Mon 27-04-20	Tue 28-04-20	10
13	Nedbrydning- eks. Fender	5 days	Tue 28-04-20	Mon 04-05-20	11
14	Installer HEB300 - 26 stk	4 days	Tue 05-05-20	Fri 08-05-20	54
15	Installer HEB300 Nordmole - 2 stk	1 day?	Mon 11-05-20	Mon 11-05-20	14
16	**Fenderpaneler**	**26 days**	**Tue 12-05-20**	**Fri 19-06-20**	
17	Hente Fenderpaneler Snaptun	2 days	Mon 18-05-20	Tue 19-05-20	
18	**Opsætning Fenderpaneler**	**24 days**	**Thu 14-05-20**	**Fri 19-06-20**	
19	Forberedende arbejder stål	3 days	Thu 14-05-20	Mon 18-05-20	60
20	Skærp plader til HEB-Fender	2 days	Sun 24-05-20	Mon 25-05-20	
21	F5+F6 detalje S2	3 days	Wed 20-05-20	Tue 26-05-20	17
22	Dykker arbejder F1-F11	4 days	Mon 25-05-20	Thu 28-05-20	
23	Forberende arbejder mole S7+S8	1 day	Wed 27-05-20	Wed 27-05-20	21
24	Forberedende arb. F11+F10+F13	2 days	Wed 27-05-20	Thu 28-05-20	21
25	F11,F10, F9	2 days	Fri 29-05-20	Tue 02-06-20	24
26	F8- F7	1 day	Wed 03-06-20	Wed 03-06-20	25
27	F4-1	2 days	Thu 04-06-20	Fri 05-06-20	26
28	F12, F13	1 day	Fri 19-06-20	Fri 19-06-20	42FS+
29	F14	1 day	Fri 19-06-20	Fri 19-06-20	42FS+
30	**Donut Fender**	**9,5 day**	**Tue 12-05-20**	**Wed 27-05-20**	
31	Ramning af Ø1016	1 day	Tue 12-05-20	Tue 12-05-20	15
32	Udstøbning af Ø1016	1 day?	Mon 18-05-20	Mon 18-05-20	
33	Donut fender påmonteres	0,5 days	Wed 27-05-20	Wed 27-05-20	32FS+ day
34	**Betonplade Mole**	**7 days**	**Sat 06-06-20**	**Tue 16-06-20**	
35	Opbrydning asfalt	0,5 day	Sat 06-06-20	Sat 06-06-20	27
36	Bortgravning grus	1 day	Sat 06-06-20	Sun 07-06-20	35
37	Reperation Spuns	1 day	Sun 07-06-20	Sun 07-06-20	36
38	Ny betonhammer	2 days	Mon 08-06-20	Tue 09-06-20	37
39	Opbygning ny grus, komprimering	1 day	Wed 10-06-20	Wed 10-06-20	38
40	Form og Armering	3 days	Thu 11-06-20	Mon 15-06-20	39
41	Klargøring støbning	1 day?	Mon 15-06-20	Mon 15-06-20	
42	Støbning mole betonplade	1 day	Tue 16-06-20	Tue 16-06-20	40
43	**Beton Nordmole fender F14**	**4 days**	**Thu 11-06-20**	**Tue 16-06-20**	
44	Form og armering	3 days	Thu 11-06-20	Sat 13-06-20	39
45	støbning F14 betonplade	1 day?	Tue 16-06-20	Tue 16-06-20	
46	**Betonhammer Øst**	**2 days**	**Mon 15-06-20**	**Tue 16-06-20**	
47	Azorbetræ forberedes	1 day	Mon 15-06-20	Mon 15-06-20	44
48	Azorbetræ monteres på spuns	1 day	Tue 16-06-20	Tue 16-06-20	47
49	**Tømmerfender**	**2 days**	**Wed 17-06-20**	**Thu 18-06-20**	
50	Montering af træ på spuns	2 days	Wed 17-06-20	Thu 18-06-20	48
51	**Mobilisation**	**22 days**	**Mon 20-04-20**	**Tue 19-05-20**	
52	Donut Fender Ank. SNA	1 day	Thu 23-04-20	Thu 23-04-20	
53	Gravmskine SNA-END	1 day?	Mon 27-04-20	Mon 27-04-20	
54	Rammemask. SNA-END	1 day	Mon 04-05-20	Mon 04-05-20	
55	HEB , SNA-END	1 day?	Mon 04-05-20	Mon 04-05-20	
56	Fender paneler truck 1+4 SNA-END	1 day?	Mon 18-05-20	Mon 18-05-20	
57	Fender panler truck 2+3 SNA- END	1 day	Tue 19-05-20	Tue 19-05-20	
58	Beton SNA-END	0,5 day	Mon 20-04-20	Mon 20-04-20	
59	Rammemask. END-SNA	1 day?	Wed 13-05-20	Wed 13-05-20	31
60	Hente Gravmakine+dykker	1 day?	Wed 13-05-20	Wed 13-05-20	31
61	Dykkerudstyr med færge	1 day?	Mon 18-05-20	Mon 18-05-20
